



# 工事だより

Vol.14  
2019.1



日頃より、工事へのご理解ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。  
さて、今号では、以下の内容につきまして、皆様にお知らせいたします。

- トンネル坑内の水抜き工事に着手【博多駅（仮称）工区】
- ナトム区間の再掘削に向けた検討状況について【博多駅（仮称）工区】
- 地下4階・地下1階（一部）の構築が完了【中間駅（仮称）西・東工区】


## 博多駅（仮称）工区

### ○トンネル坑内の水抜き工事に着手



大断面トンネル部の再掘削に向けて、平成31年1月18日から、**トンネル坑内に溜まった地下水の水抜き工事に着手**いたしました。

工事は、**立坑部（防音ハウス内）から実施**し、施工にあたっては各種計測管理を行うなど、事故防止に万全を期しながら安全に進めてまいります。

なお、水抜き工事の完了後は、引き続き、立坑部からトンネル坑内に堆積した土砂の撤去工事を実施いたします。

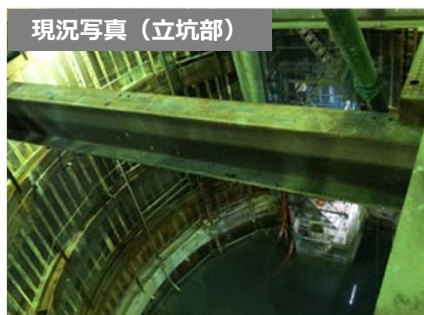

現況写真（立坑部）

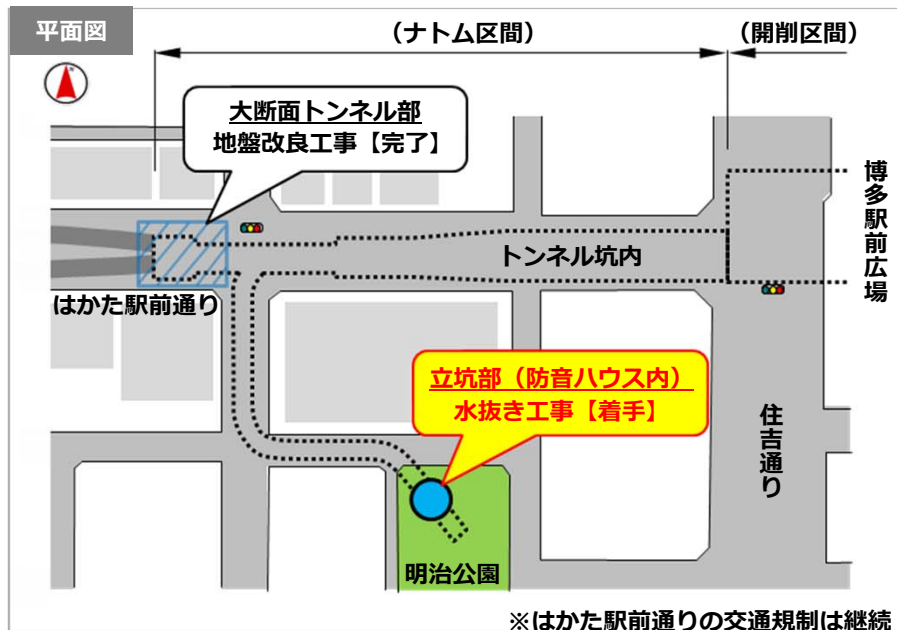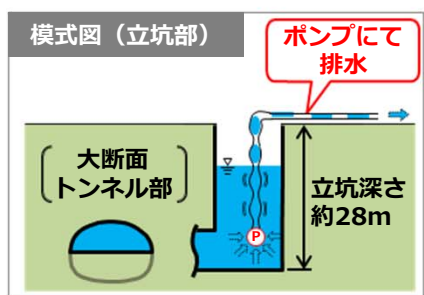

### ○ナトム区間の再掘削に向けた検討状況について

平成30年11月29日に開催されました「福岡市地下鉄七隈線建設技術専門委員会」におきまして、ナトム区間の掘削計画について議論が行われました。

その結果を踏まえ、掘削手順やトンネル坑内から実施する補助工法など、**大断面トンネル部の再掘削を安全に進めるための施工方法**を決定しました。

今後も、掘削計画について詳細な検討を進め、**安全を第一**に取り組んでまいります。



〔今後の工程見込み〕

## 中間駅(仮称)西・東工区

### ○地下4階・地下1階(一部)の構築が完了

中間駅(仮称)西・東工区では、将来駅のホームとなる地下4階や、駅コンコースとなる地下1階の一部について、構築が完了いたしました。


引き続き、駅舎等の構築工事を進めていくとともに、今後予定するシールド工法によるトンネル構築に向けた準備を進めてまいります。





<地下1階(一部)の構築完了>



<地下4階の構築完了>

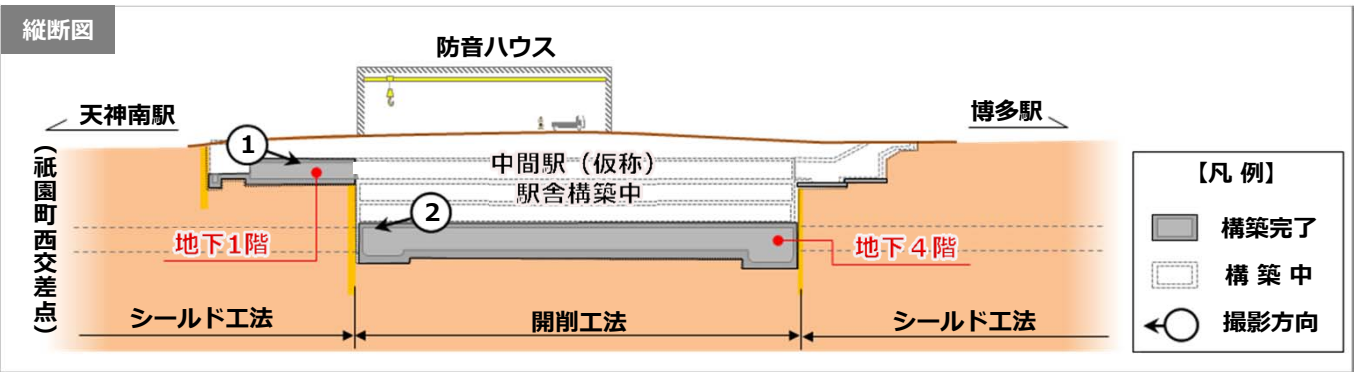

## 工事概要図

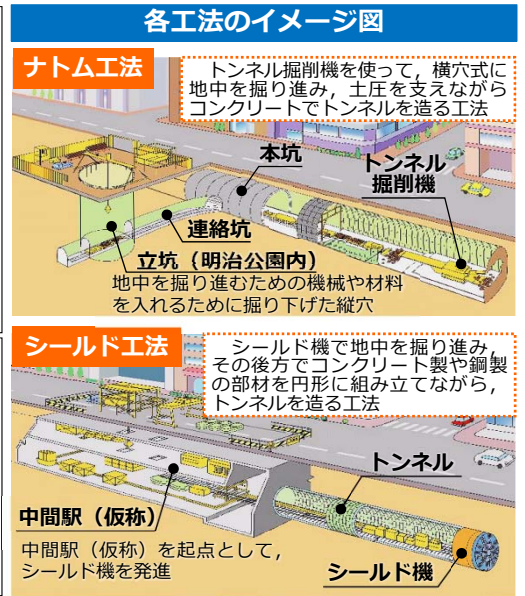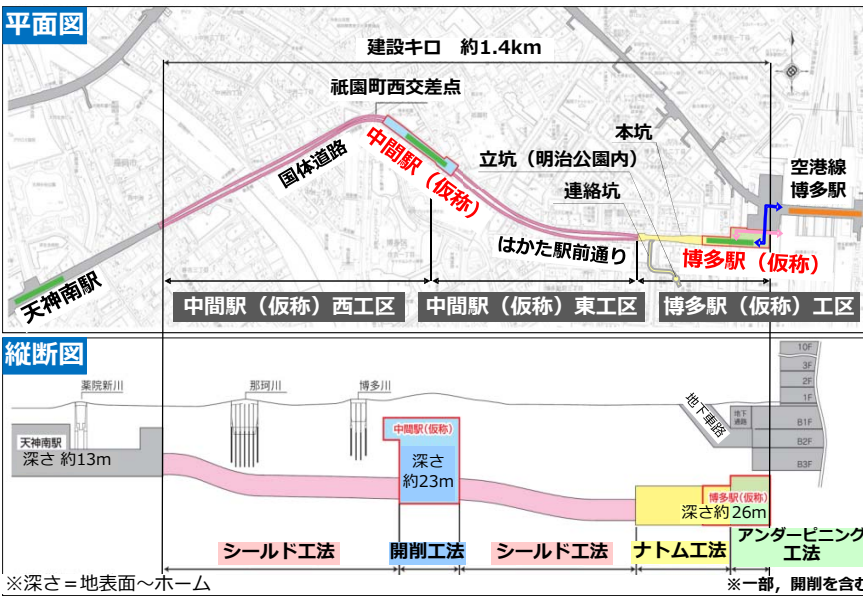

見てね!



×××

福岡市交通局ホームページアドレス  
<http://subway.city.fukuoka.lg.jp/>

## お問い合わせ先

### ■工事だよりに関すること

福岡市交通局 建設部 建設課  
 担当：日高・山崎  
 電話：092-732-4205 FAX：092-732-4244  
 MAIL：kensetsu.TB@city.fukuoka.lg.jp

### ■工事の内容に関すること

福岡市交通局 建設部 工事事務所  
 担当：花本・高田  
 電話：092-409-5830 FAX：092-409-6290  
 MAIL：koji.TB@city.fukuoka.lg.jp
