



工事だより

Vol.17
2019.12



日頃より、工事へのご理解ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
さて、今号では、博多駅（仮称）工区における大断面トンネル部の掘削完了や、
中間駅（仮称）西・東工区のシールド発進につきまして、皆様にお知らせいたします。


博多駅(仮称)工区

◎大断面トンネル部の掘削が完了<ナトム区間>

はかた駅前通りの地下において、トンネル工事を進めている博多駅（仮称）工区のナトム区間では、
令和元年9月に大断面トンネル部の掘削が完了しました。



▲ 大断面トンネル部の掘削完了（令和元年9月）

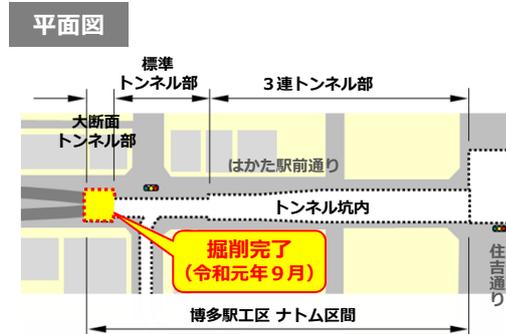


掘削が完了した大断面トンネル部は、地下水の浸入を防ぐため、トンネル全体を防水シートで覆った後、現在は、鉄筋の組み立て等のトンネル構築を行っています。

今後も、**事故防止に万全を期しながら安全第一**で工事を進めていきます。



▲ トンネル構築の状況（令和元年11月）

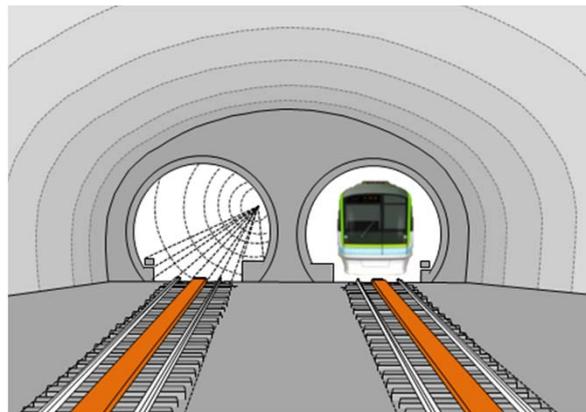

▲ 大断面トンネル部の完成イメージ

中間駅(仮称)西・東工区

○2機のシールドマシンが発進 <天神南駅～中間駅(仮称)間> <中間駅(仮称)～博多駅(仮称)間>

中間駅(仮称)西・東工区では、令和元年11月に中間駅(仮称)駅舎部から2機のシールドマシンが発進しました。それぞれ、天神南駅方面・博多駅方面に向けて掘進を進めています。

なお、天神南駅～中間駅(仮称)間では、すでに1本目のシールド掘進が完了し、今回は2本目となります。また、博多駅方面に向けて発進したシールドマシンは、博多駅(仮称)工区の大断面トンネル部に到達した後、トンネル内で反転し、中間駅(仮称)駅舎部に向けて再発進する計画です。





▲博多駅方面に向けて発進したシールドマシンの内部



▲シールドマシンの外観

工事概要図

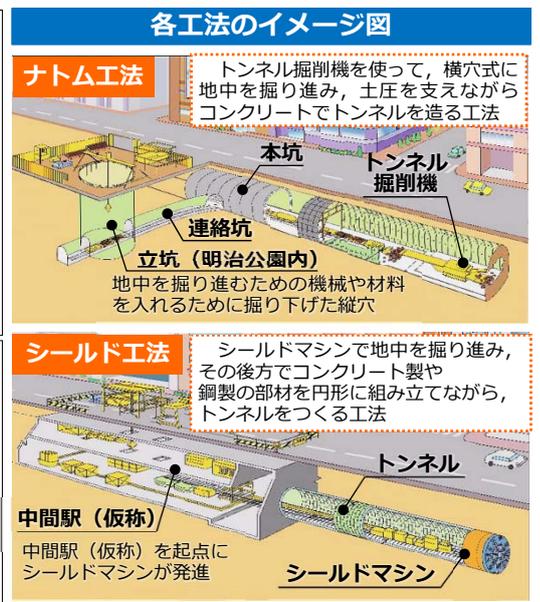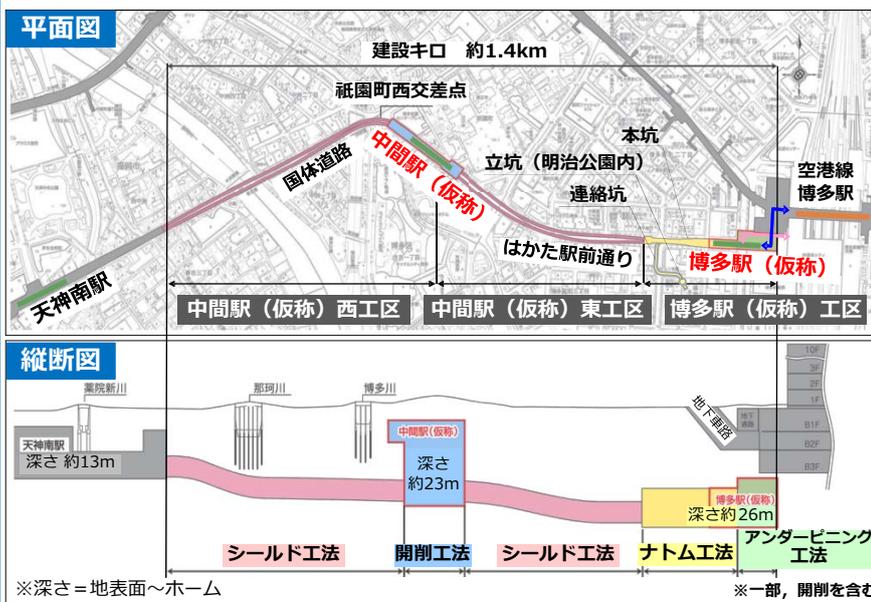

見てね!



福岡市交通局ホームページアドレス
<https://subway.city.fukuoka.lg.jp/>

お問い合わせ先

■工事だよりに関すること

福岡市交通局 建設部 建設課
担当：日高・山崎
電話：092-732-4205 FAX：092-732-4244
MAIL：kensetsu.TB@city.fukuoka.lg.jp

■工事の内容に関すること

福岡市交通局 建設部 工事事務所
担当：花本・井邊
電話：092-409-5830 FAX：092-409-6290
MAIL：koji.TB@city.fukuoka.lg.jp
